




академпарк

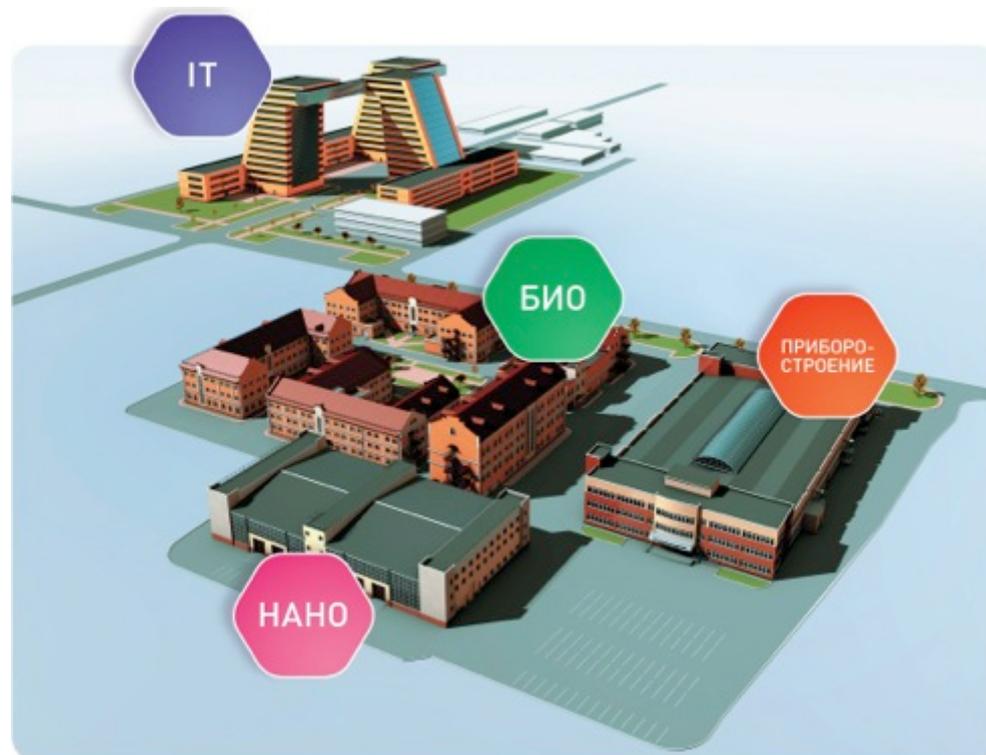

**НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
«АКАДЕМПАРК»**

# НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АКАДЕМПАРК»

участник Комплексной программы с 2007 г.

## Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	342 250	74% (255 729)	305 181
2008	388 500	82% (318 463)	263 302
2009	311 250	100% (311 250)	463 107
2010	194 227	100% (194 227)	654 034
2011	500 000	100% (500 000)	606 306
2012	400 000	100% (400 000)	400 000
2013	70 000	100% (70 000)	368 721
2014	-	-	-
<b>Итого 2007-2014</b>	<b>2 206 227</b>	<b>93% (2 049 669)</b>	<b>3 060 651</b>

\*Перенос остатков средств федерального бюджета:


**остаток** 2007 года в размере 86 520 тыс.руб. возвращен в 2010 году (64 606,4 тыс.руб.), в 2011 году (21 914, тыс.руб.)

**остаток** 2008 года в размере 70 036,5 тыс.руб. возвращен в 2010 году

**остаток** 2009 года в размере 17 тыс.руб. , возвращен в 2011 году

## Ход строительства объектов технопарка

(нарастающим итогом)

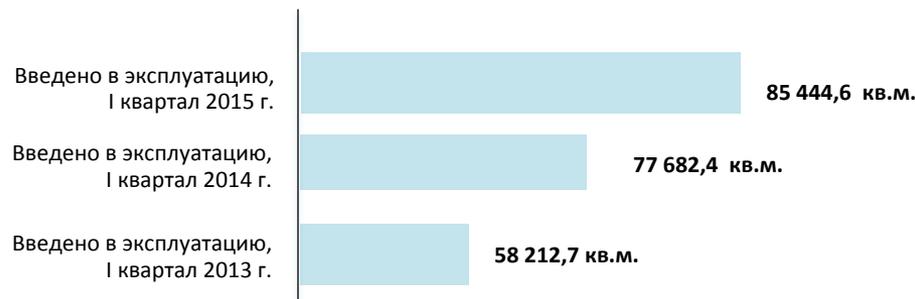

## Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Выводы

### Строительство объектов технопарка продолжается:

- Введено в эксплуатацию 85 444,6 кв.м. площади объектов технопарка;
- Общий объем инвестиций на создание технопарка по соглашениям с Минкомсвязью РФ – 5110,3 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 2049,7 млн. руб.;
- Сумма перенесенных остатков средств федерального бюджета составила 100 млн. руб.;
- Привлечённые инвестиции резидентов составили 3990 млн. руб., доп. инвестиции из регионального бюджета, не вошедшие в соглашения – 830 млн. руб. **Всего инвестировано - 9,93 млрд. руб.**

# НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АКАДЕМПАРК»

Общая площадь земельных участков: 103 102 м<sup>2</sup>;

Общая площадь объектов технопарка: 85 444,6 кв. м.

участник Комплексной программы с 2007 г.

Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных, 22 172,8 м<sup>2</sup> (2012 год)

Здание Центров коллективного пользования Технопарка, 20 571,4 м<sup>2</sup> (2014)

Здание производственного назначения, 997 м<sup>2</sup> (2015)

Административные здания, №1, №2, 3 250 м<sup>2</sup> (2012 год)

Производственное здание с административными помещениями, 4 564,25 м<sup>2</sup> (2015 год)

Здание многофункционального назначения, 6 559 м<sup>2</sup> (2015 год)


Административное здание №3, 3 754,4 м<sup>2</sup> (2014 год)

Комплекс общественного питания, 2 213,4 м<sup>2</sup> (2015 год)

Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов (включая Биоинкубатор) 19 558 м<sup>2</sup> (2011 год)

Центр наноструктурированных материалов, 4 483 м<sup>2</sup> (2011 год)

Центр технологического обеспечения, 9 442 м<sup>2</sup> (2010 год)

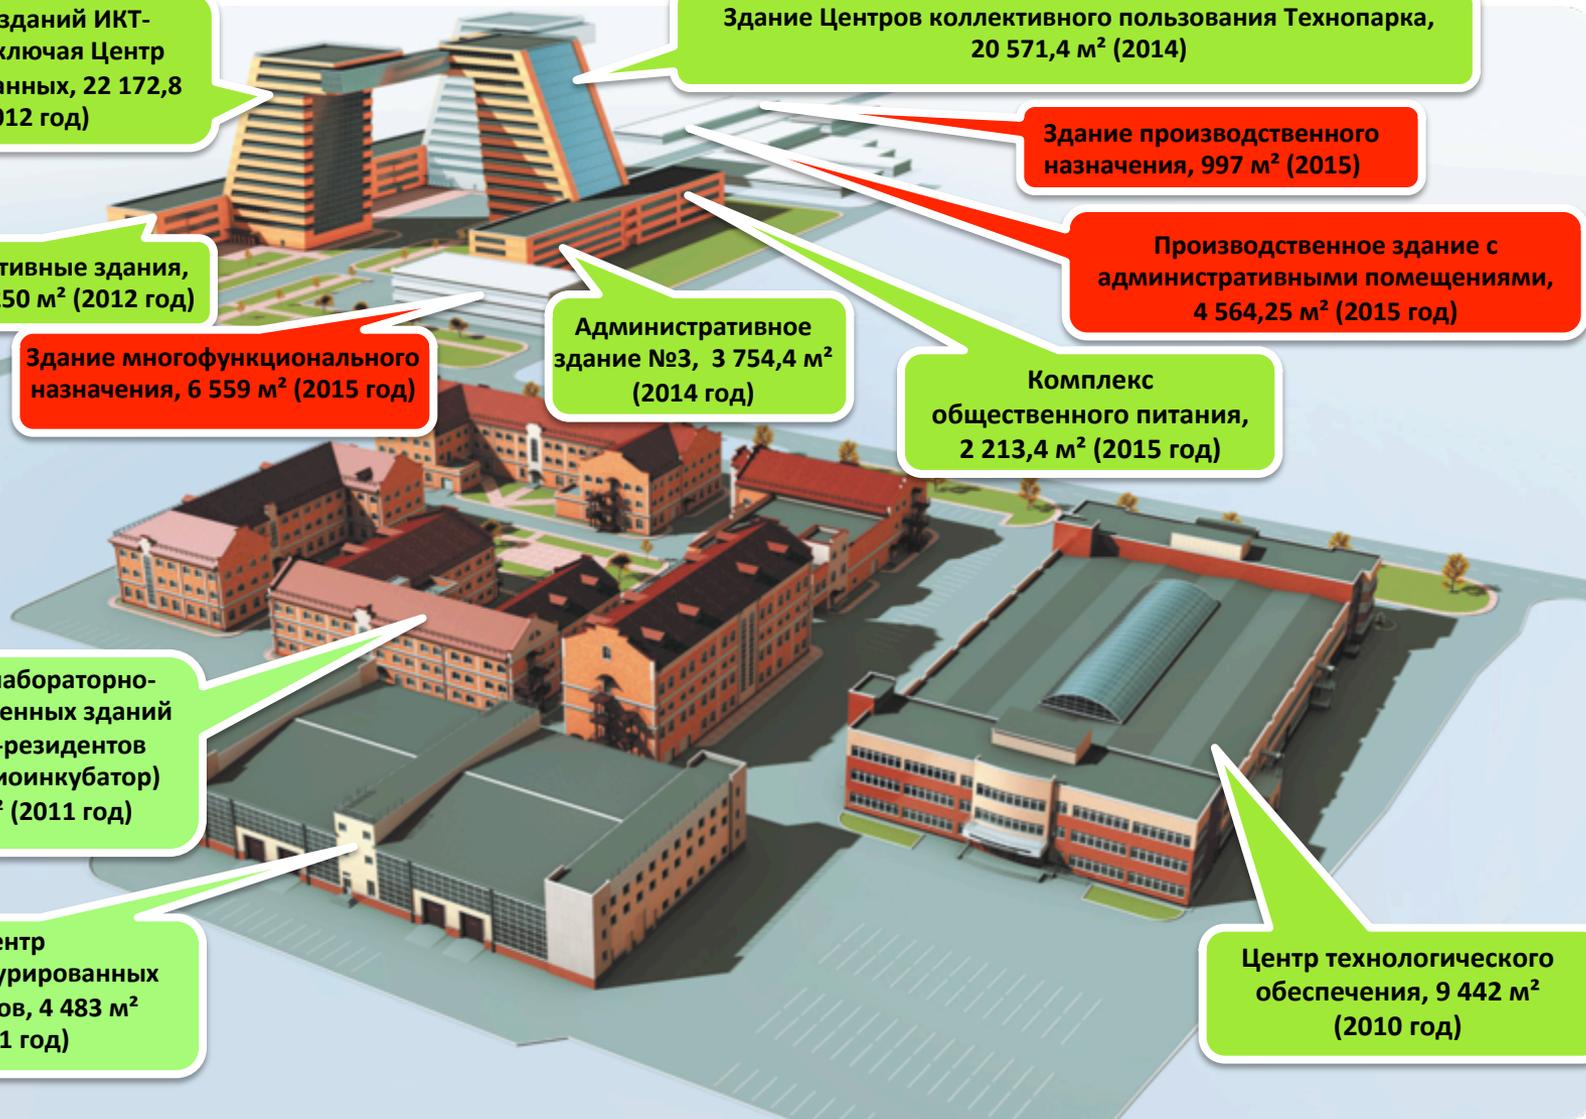

# НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АКАДЕМПАРК»

участник Комплексной программы с 2007 г.

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

**Здание Центров коллективного пользования Технопарка по ул. Николаева, в Советском районе г. Новосибирска**

- Площадь - 20 571 м<sup>2</sup>
- годы строительства 2009-2014,
- сметная стоимость 1 412,7 млн. руб.



**Административное здание №3**

- Площадь 1 625,5 кв.м.
- годы строительства 2012-2014,
- сметная стоимость 96,91 млн. руб.



Объекты технопарка, созданные в 2015 г.

**Комплекс общественного питания**

- Площадь – 2 213,4 кв.м.
- годы строительства 2012-2015,
- сметная стоимость 100,8 млн. руб.



**Инженерная инфраструктура технопарка**

№ п/п	Объект	Вложено средств фед. бюджета (тыс.руб.)	Вложено средств рег. бюджета (тыс.руб.)	Общая стоимость (тыс.руб.)	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Электроснабжение	72 516,3	449 684,9	522 201,2	2011	2011
2	Теплоснабжение	31 003,2	43 198,7	74 201,9	2010	2010
3	Водоснабжение	238 104,6	300 803,6	538 908,2	2011	2011
4	Водоотведение	267 608,3	842 520,5	1 110 128,8	2011	2011
<b>Итого:</b>		<b>609 232,40</b>	<b>1 636 207,70</b>	<b>2 245 440,10</b>		

# НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АКАДЕМПАРК»

участник Комплексной программы с 2007 г.

## Строящиеся объекты технопарка

### Лабораторное здание (Здание № 6)

- Площадь 445,3 кв.м.
- годы строительства 2014-2015,
- сметная стоимость 18,44 млн. руб.



### Здание многофункционального назначения

- Площадь – 6 559 кв.м.
- годы строительства 2014-2016,
- сметная стоимость 155,68 млн. руб.



### Производственное здание с административными помещениями

- Площадь 4 564,25 кв. м.,
- годы строительства 2011-2015,
- сметная стоимость 138 млн. руб.



### Здание производственного назначения

- Площадь 997 кв. м.
- годы строительства 2013-2015,
- сметная стоимость 27 млн. руб.



# НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «АКАДЕМПАРК»

участник Комплексной программы с 2007 г.

## Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану 2012 года)


Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 план	Итоговый план в 2018 году**
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	130	127	154	156	176	171	193	225
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	2 773	2 868	3 828	3 830	4 690	4 500	5 260	8 510
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	5 007	5 012	6 400	6460	8 234	9 623	10 095	16 540
Бюджетная эффективность проекта (млн. руб.)	630	635	823	829	1033	1 172	1 088	1758
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	60 411,3	58 212,7	81 229,3	77 682,4	92 499,5	83 231,2	95 359,4	170 545,9

## Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

### Технопарк функционирует:

- Запущены: ЦКП, Нанотехнологический бизнес-инкубатор, «Коворкинг», учебный центр «Zoomer», межвузовская магистратура по инжинирингу, строительство коттеджного поселка для резидентов);
- Проведено 280 мероприятий и конференций, количество участников 21,2 тыс. чел.;
- Привлечено из Фонда Содействия развитию МП в НТС, РВК, ФРИИ, фонда Сколково, частных инвесторов 137,2 млн. руб. инвестиций в проекты резидентов технопарка.

Структура резидентов технопарка

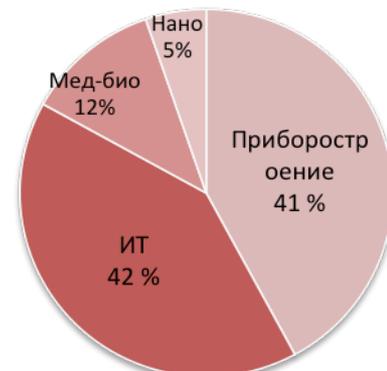



**ТЕХНОПАРК**  
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
**РАМЕЕВ**



**ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Технопарк «РАМЕЕВ»**

# ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «РАМЕЕВ»

участник Комплексной программы с 2011 г.

### ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Год	Федеральный бюджет	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	-	-	20 000,0
2011	259 000	23,4% 60 494,8	63 254,6
2012	164 000	46% 134 486,5*	205 401,6
2013	330 537,4	56% 228 018,8**	299 478,6
2014	356 000	99,7% 683 104,71***	630 662,1****
Итого 2007-2014	<b>1 109 537,4</b>	<b>99,7% 1 106 104,71</b>	1 218 796,9

\* Включая остаток средств 2011 года в размере 198 505,2 тыс.руб.


\*\* Включая остаток средств 2012 года в размере 228 018,8 тыс.руб.

\*\*\* Включая остаток средств 2013 года в размере 330 537,4 тыс.руб.

\*\*\*\* Включая кредиторскую задолженность и принятые обязательства.

Фактическое освоение (кассовый расход) за 2014 год – 165,4 млн.руб.

### Ход строительства объектов технопарка

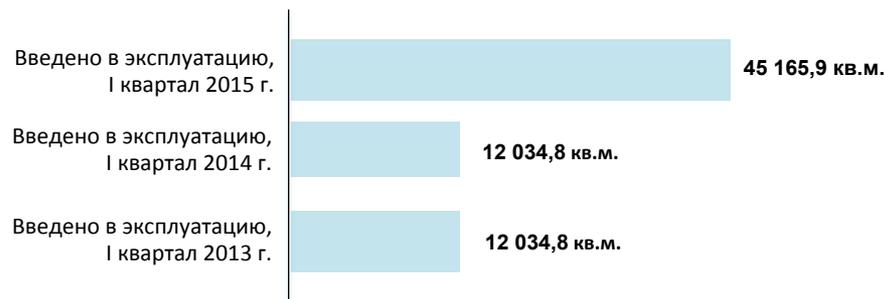

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный Бюджет (млн.руб.)	0	164,5	144,9	373,7	683,1
Региональный Бюджет (млн.руб.)	0,1	1,9	5,5	157,9	165,4
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0,1</b>	<b>166,4</b>	<b>150,4</b>	<b>531,6</b>	<b>848,5</b>

### Выводы

- **Строительство объектов технопарка завершено.**
- Введено в эксплуатацию 45 165,9 кв.м. площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка – 2 328,33 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 1 109,54 млн. руб. (освоено – 1 106,1 млн. руб.).
- Сумма перенесенных остатков средств федерального бюджета за 2011-2013 годы составила 757,0614 млн. руб.


# ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «РАМЕЕВ»

участник Комплексной программы с 2011 г.

Общая площадь земельных участков 6,785 га.

Общая площадь объектов технопарка 45 165,9 кв. м.

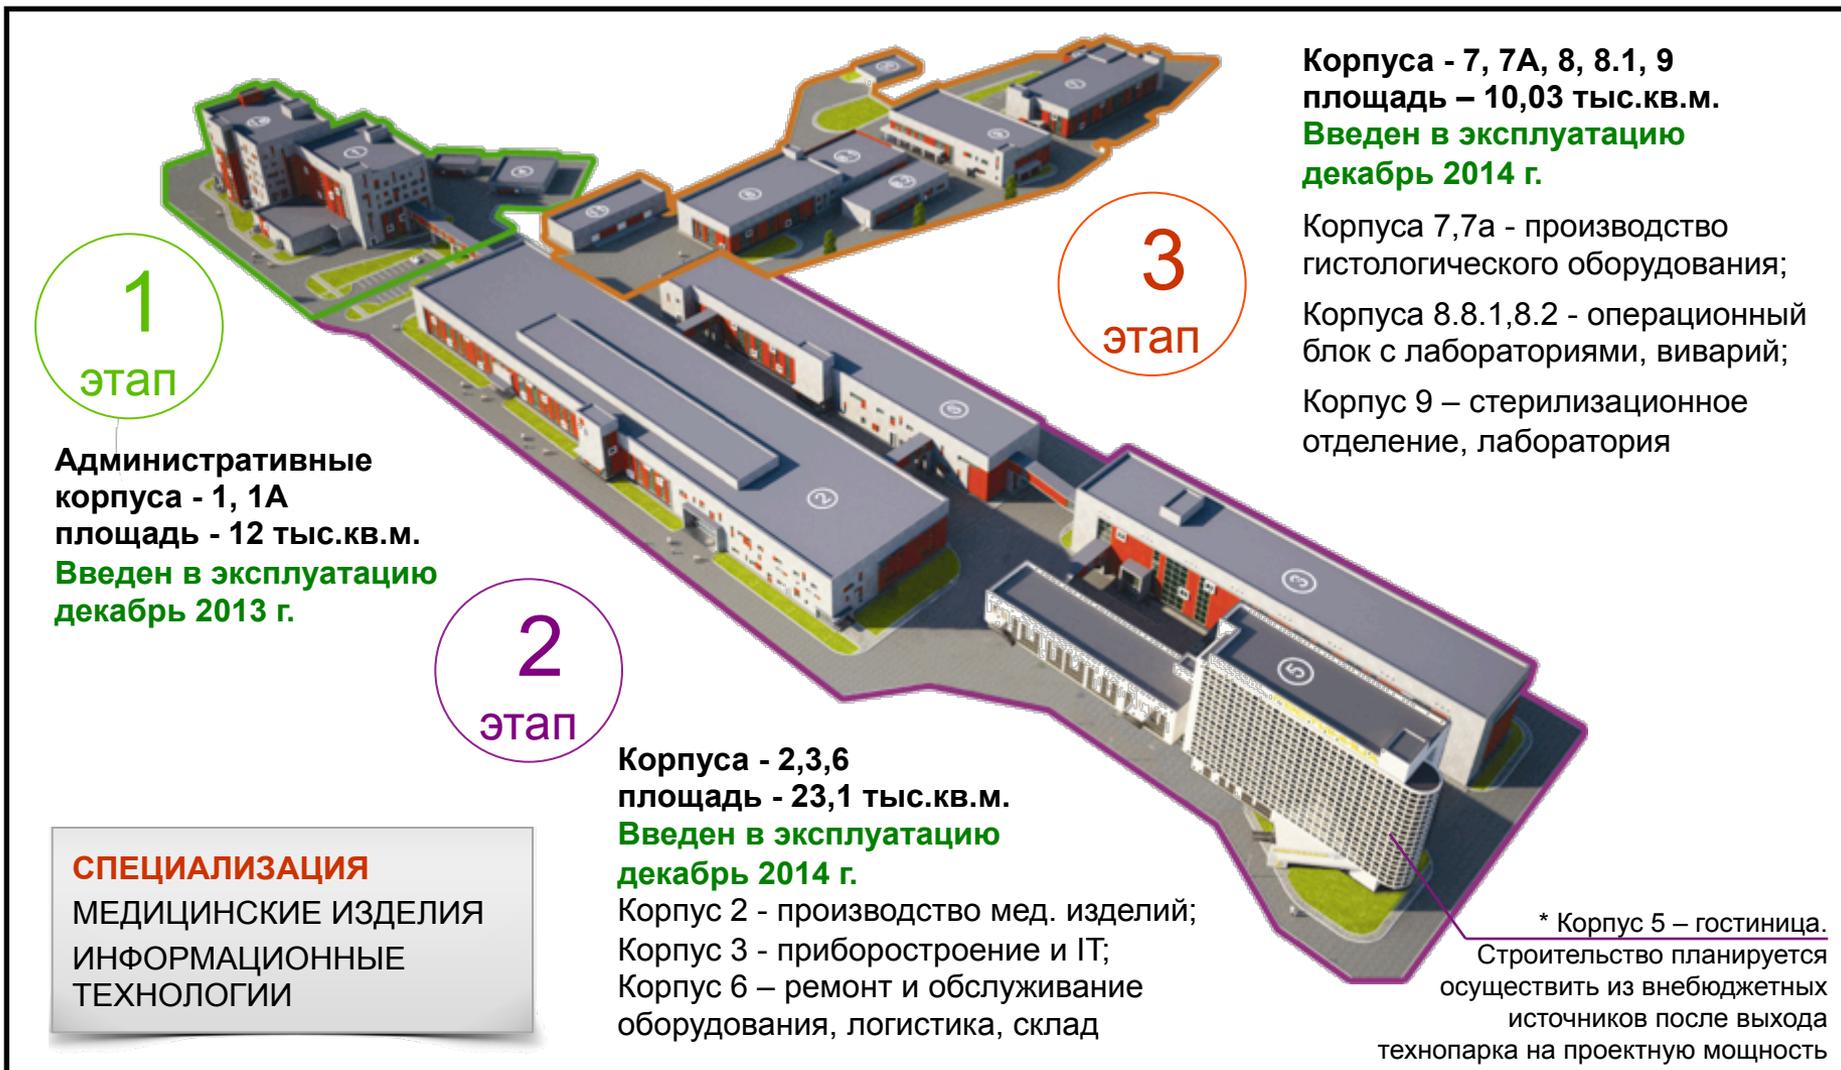

# ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «РАМЕЕВ»

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

### Корпус № 2

**Производство мед.изделий,  
механообработка, роботостроение**

- площадь – 6286,77 кв.м.,
- годы строительства - 2012-2014,
- профинансировано из ФБ – 214,85 млн. руб.



### Корпус № 3

**Информационные технологии**

- площадь – 5437,4 кв.м.,
- годы строительства – 2014 год,
- профинансировано из ФБ – 97,4 млн. руб.



### Корпус № 6

**Склад, логистический центр**

- площадь – 5090 кв.м.,
- годы строительства – 2014 год,
- профинансировано из ФБ – 112,57 млн. руб.



**участник Комплексной программы с 2011 г.**

### 2 этап строительства технопарка

Площадь 23,1 тыс. кв. м., годы строительства 2012-2014,  
сметная стоимость 1 307,64 млн.руб. (в т.ч.

**профинансировано из ФБ – 473,72 млн.руб.)**

## Инженерная инфраструктура 2 этапа технопарка

№ п/п	Объект (заполняется укрупненно)	Вложено средств фед. бюджета, млн.руб.	Вложено средств рег. бюджета, тыс.руб.	Ввод в эксплуатацию	
				план	факт
1	Инженерная инфраструктура: внутриплощадочные наружные сети, канализация, сооружения водо-, тепло-, газо-снабжения, благоустройство 2-ого этапа	48,9	-	2 кв.2014	4 кв.2014

# ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «РАМЕЕВ»

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

### Корпуса № 7, 7а

Производство гистологического оборудования

- площадь – 2449,2 кв.м.,
- период строительства – 2014 год,
- профинансировано из ФБ – 55,3 млн. руб.



### Корпуса № 8, 8.1, 8.2

Проведение испытаний медицинских изделий на животных

- площадь – 4832,2 кв.м.,
- период строительства – 2014 год,
- профинансировано из ФБ – 120,1 млн. руб.



### Корпус № 9

Стерилизаторное отделение, прачечная

- площадь – 2318,1 кв.м.,
- период строительства – 2014 год,
- профинансировано из ФБ – 65,13 млн. руб.



## Инженерная инфраструктура 3 этапа технопарка

№ п/п	Объект (заполняется укрупненно)	Вложено средств фед. бюджета, млн.руб.	Вложено средств рег. бюджета, тыс.руб.	Ввод в эксплуатацию	
				план	факт
1	Складское здание № 10	9,97	-	2 кв.2014	4 кв.2014
2	Контрольно-пропускной пункт №14	1,49	-	2 кв.2014	4 кв.2014
3	Аккумуляторная № 11	7,17	-	2 кв.2014	4 кв.2014
4	Внутриплощадочные наружные сети, канализация, сооружения водо-, тепло-, газо-снабжения, благоустройство 3-ого этапа	33,5	-	2 кв.2014	4 кв.2014

участник Комплексной программы с 2011 г.

### 3 этап строительства технопарка

Площадь 10,03 тыс. кв. м., год строительства 2014, сметная стоимость 755,57 млн.руб. (в т.ч.

профинансировано из ФБ – 292,7 млн.руб.)

# ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «РАМЕЕВ»

участник Комплексной программы с 2011 г.


### Исполнение целевых показателей (до 2015 года - по соглашению 2014 года, с 2015 года – по конкурсной заявке 2013 года)

Наименование показателя	2012		2013		2014 год		2015 год (план)	Итоговый план в 2018 году
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний-резидентов (ед.)	-	-	-	-	17	12	44	70
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	-	-	-	-	270	287	1010	1 985
Годовой объем выручки резидентов (млн. рублей)	-	-	-	-	0,75	567,69	1 250,0	3 722,0
Бюджетная эффективность проекта (млн.руб.)	-	-	-	-	0,05	60,4	116,416 (5% * 2328,33 млн.руб.)	1 280,0 (55% * 2328,33 млн.руб.)
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	-	-	12,486	12,034	46,037	45,16	45,16	45,16

### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- **Технопарк функционирует**
- В 2014 году введены в эксплуатацию объекты 2 и 3 этапов: корпуса по производству мед. изделий, высокоточной механообработки, размещения IT-компаний, операционные отделения, виварий, стерилизационные отделения и др.
- Проведено 16 региональных мероприятий и конференций в технопарке;
- В 2015 году будет завершена передача управляющей компании технопарка имущества 2 и 3 этапов.

Структура резидентов технопарка

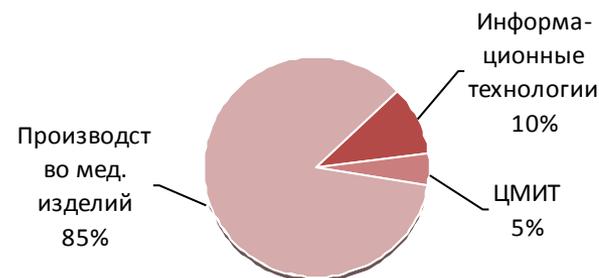



**РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ:  
«ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»**

# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: «ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

участник Комплексной программы с 2009 г.


## Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс. руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	456 979,5	100% (456 979,5)	456 979,5
2010	580 867,5	100% (580 867,5)	580 867,5
2011	-	-	164 849
2012	269 772,9	100% (269 772,9)	358 880,3
2013	170 738,4	0% (0)	231 511,1
2014	122 207,7	100% (292 946,1*)	187 505,2
<b>Итого 2007-2014</b>	<b>1 600 566,0</b>	<b>100% (1 600 566,0)</b>	<b>1 980 592,6</b>

\* с учетом перенесенных средств 2013 года в размере 170 738,4 тыс. руб.

\*\* возврат остатков федеральных средств за период 2007-2014 гг. составил 0 тыс. руб.

## Ход строительства объектов технопарка



## Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	116 834,7	66 384,4	109 727,0	292 946,1
Региональный бюджет (тыс. руб.)	-	165 351,3	49,4	22 104,5	187 505,2
<b>Итого (тыс. руб.):</b>	<b>-</b>	<b>282 186,0</b>	<b>66 433,8</b>	<b>131 831,5</b>	<b>480 451,3</b>

## Выводы

- **Строительство объектов технопарка продолжается.**
- Введено в эксплуатацию 42 444,5 кв.м. площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка – 3 581,16 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 1 600,57 млн. руб. (освоено – 1 600,57 млн. руб.).
- Сумма возврата средств федерального бюджета составила 0 руб.

# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: «ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

участник Комплексной программы с 2009 г.

Общая площадь земельных участков: 8,78 га.

Общая площадь объектов: 48 838,2 кв. м.



# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: «ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

участник Комплексной программы с 2009 г.

## Центр проектирования инноваций (ЦПИ)

- Площадь – 3 991 кв. м.,
- Годы строительства – апрель-декабрь 2014 г.,
- сметная стоимость – 495 169,09 тыс. руб. (в т. ч. профинансировано из ФБ в 2014 г. – 292 946,1 тыс. руб.)




Дата съемки  
III кв. 2014



Дата съемки  
I кв. 2015

## Инжиниринговый центр волоконной оптики (ИЦВО)

- Площадь – 6 393,7 кв. м.,
- Годы строительства – июль 2013 - март 2015 г.,
- сметная стоимость – 3 082 704,24 тыс. руб. (финансируется из других источников)

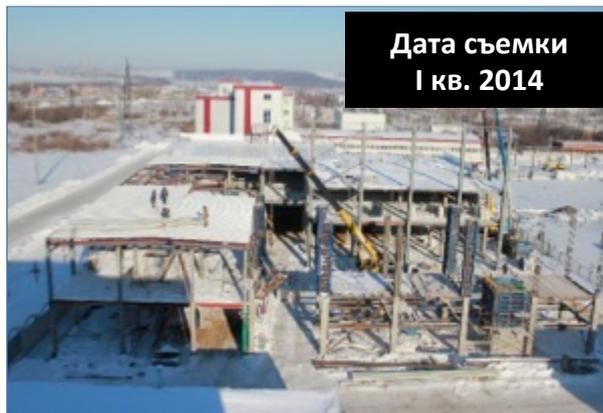

Дата съемки  
I кв. 2014



Дата съемки  
I кв. 2015

## Инженерная инфраструктура технопарка

№ п/п	Объект	Вложено средств фед. Бюджета (тыс. руб.)	Вложено средств рег. Бюджета (тыс. руб.)	Общая Стоимость (тыс. руб.)	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Объекты электроснабжения	6 318,27	-	6 318,27	2014 год	2014 год
2	Объекты теплоснабжения	47 056,64	-	47 056,64	2014 год	2014 год

# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: «ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

участник Комплексной программы с 2009 г.


## Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану развития технопарка 2011 г.)

Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 план	Итоговый план в 2019 году
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	24	24	39	44	60	<b>63</b>	75	130
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	701	764	1 150	1 176	1 479	<b>1 643</b>	1 750	2410
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	282,1	423,9	450,00	582,31	850,00	<b>1 455,30</b>	1 530,30	1950
Бюджетная эффективность проекта (млн. руб.)	0	18,71	0	78,91	0	<b>635,87</b>	650,00	953,00
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	30,22	30,22	38,45	38,45	48,87	<b>42,44</b>	48,84	48,84

## Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- Технопарк функционирует
- В 2014 г. был введен в эксплуатацию Центр проектирования инноваций (ЦПИ, 1 этап);
- Проведено более 50 мероприятий и конференций в технопарке;
- При участии в конкурсном отборе субъектов РФ на реализацию программ развития пилотного инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» Минэкономразвития РФ из средств федерального бюджета РФ было получено 202 902,9 тыс. руб. в т. ч. на развитие Центра энергосберегающей светотехники 167 074,3 тыс. руб., на обеспечение деятельности ИЦЭС 18 728,6 тыс. руб., на обеспечение деятельности спецорганизации (АУ «Технопарк-Мордовия») – 17 100, 0 тыс. руб.

Структура резидентов технопарка





park



**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН:  
ИТ-ПАРК (Г. КАЗАНЬ)  
ТЕХНОПОЛИС «ХИМГРАД» (Г. КАЗАНЬ)  
ИТ-ПАРК (Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)**

## Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	209 610	100 % (209 610)	412 630
2008	596 440	100 % (596 440)	895 799
2009	769 605	99 % (763 640)	683 340
2010	454 623	100 % (454 622)	31 254
2011	-	-	49 717
2012	-	-	129 170
2013	-	-	175 166
2014 (факт)	-	-	11 670
<b>Итого 2007-2014</b>	<b>2 030 278</b>	<b>-</b>	<b>2 388 746</b>



## Созданные объекты на 01.01.15

№	Объект	Объем финансирования из федерального бюджета
1	Объекты <b>ИТ-парка Казани</b> , в том числе -здание делового центра (30 354 кв.м.)* (Дата-центр, конференц-залы, кафе, почтовое отделение, бизнес-инкубатор) -два прилегающих здания -апартамент-отель	1 316 590
2	Объекты <b>технополиса «Химград»</b> , в том числе: -административно-бытовой корпус (2 000 кв.м.) -производственный корпус (8 000 кв.м.) -административные здания (30 000 кв.м.)	713 680

## Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет (млн.руб.)	1,24	7,67	0	2,76	11,67
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>1,24</b>	<b>7,67</b>	<b>0</b>	<b>2,76</b>	<b>11,67</b>

## Выводы

- ✓ Общий объем инвестиций на создание «ИТ-парк» (г. Казань), «Химград» (г. Казань) за счет бюджетных средств - 4 419 млн. руб., из них средств федерального бюджета 2 030 млн. руб.
- ✓ Планы по строительству объектов «ИТ-парка» и «Химграда» выполнены в полном объеме
- ✓ Общая площадь объектов «ИТ-парка», введенных в эксплуатацию, составляет 32 000 кв.м.
- ✓ Общая площадь объектов парка высоких технологий «Химград», введенных в эксплуатацию, составляет более 70 000 кв.м.

# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

## КАЗАНЬ: «ИТ-ПАРК», «ХИМГРАД»

участник Комплексной программы с 2007 года

«ИТ-ПАРК» открыт с 2009 года, «ХИМГРАД» открыт с 2010

### «ИТ-парк», г. Казань

- площадь земельного участка – 1,35 га.
- площадь объектов технопарка – 30 354,7 кв.м.
- годы строительства – 2007-2009 года
- сметная стоимость – 2 978 млн.руб.
- профинансировано из ФБ – 1 316 млн. руб.



# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

## КАЗАНЬ: «ИТ-ПАРК», «ХИМГРАД»

участник Комплексной программы с 2007 года

«ИТ-ПАРК» открыт с 2009 года, «ХИМГРАД» открыт с 2010



# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

## КАЗАНЬ: «ИТ-ПАРК», «ХИМГРАД»

участник Комплексной программы с 2007 года

«ИТ-ПАРК» открыт с 2009 года, «ХИМГРАД» открыт с 2010



**Модульный производственный корпус  
зд. 2001**

площадь: 810 кв.м.  
сметная стоимость: 238,54 млн. руб.  
дата съемки: 27.07.2010



**Административно-бытовой корпус (АБК)  
зд. 272**

площадь: 2 000 кв.м.  
сметная стоимость: 54,19 млн. руб.  
дата съемки: 21.09.2010



**Полнокомплектный быстровозводимый  
модуль аварийно-спасательной службы**

площадь: 835,8 кв.м.  
сметная стоимость: 41,77 млн. руб.  
дата съемки: 21.09.2011



**Водоочистная станция  
зд. 282А**

площадь: 868,8 кв.м.  
сметная стоимость: 85,33 млн. руб.  
дата съемки: 02.04.2012



**ГПП «Магнит»  
2x25 МВт**

сметная стоимость: 166,31 млн. руб.  
дата съемки: 04.04.2012



**КПП «Центральный» на 4 въезда  
с благоустройством территории**

сметная стоимость: 16,24 млн. руб.  
дата съемки: 21.09.2010

**Исполнение целевых показателей «ИТ-парк»** (по Бизнес-плану, составленному на период 2010-2014 гг.)

Наименование показателя	2011		2012		2013		2014	
	план*	факт	план	факт	план	факт	план*	факт
Количество компаний – резидентов (ед.)	82	53	54	56	56	53	124	62
Кол-во созданных рабочих мест (ед.)	1 480	1 512	1 700	2 181	2 000	2 250	2 000	2 464
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	2 506	2 637	3 980	4 570	4 681,6	4 951,5	5 576	5 651
Площадь объектов (м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	30 354,7	30 354,7	30 354,7	30 354,7	30 354,7	30 354,7	30 354,7	30 354,7

**!** По состоянию на 01.01.2015 доля загрузки площадей технопарка резидентами составляет 100%

\*Соглашением о предоставлении бюджету Республики Татарстан субсидии из федерального бюджета не предусмотрены плановые значения целевых показателей эффективности. В связи с этим, данные предусмотрены на основании целевых показателей эффективности, предусмотренные в последней редакции бизнес-плана

**Структура резидентов технопарка**



**Исполнение целевых показателей «Химград»** (по Бизнес-плану, составленному на период 2010-2014 гг.)

Наименование показателя	2011		2012		2013		2014	
	план*	факт	план	факт	план	факт	план*	факт
Количество компаний – резидентов (ед.)	177	170	267	200	274	230	274	<b>250</b>
Кол-во созданных рабочих мест (ед.)	7 965	5 088	10 680	6 020	10 140	6 752	10 140	<b>6 857</b>
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	13 620	8 118,7	16 350	11 347,6	19 550	14 649	21 950	<b>16 092,3</b>
Площадь объектов (м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	19 404	19 404	20 373,1	20 373,1	20 373,1	20 373,1	20 373,1	<b>20 373,1</b>

Технополис «Химград» принимает участие в мероприятиях направленных на развитие промышленных парков химической и смежных отраслей, в том числе инициирует контакты резидентов с международными компаниями, заинтересованными в сотрудничестве и реализации совместных проектов. Основными мероприятиями по поддержке резидентов на международном рынке являются совместное участие в международных выставках, форумах и конференциях.



### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	<b>221 000</b>	<b>100 %</b>	<b>221 000</b>
2012	<b>226 500</b>	<b>100 %</b>	<b>718 288</b>
2013	-	-	-
2014	-	-	<b>73 540*</b>
Итого 2007-2014	<b>447 500</b>	<b>100 %</b>	<b>1 012 828</b>

\* Дополнительно вне соглашения за счет средств бюджета Республики Татарстан выделены средства дооснащение и переустройство блоков Б, В и В1 на сумму 73,5 млн. руб.

### Выводы

- ✓ Общий объем инвестиций на создание технопарка – 1 460,3 млн. руб., из них средств федерального бюджета - 447,5 млн. руб.
- ✓ Планы по строительству объектов «ИТ-парка» в г. Набережные Челны выполнены в полном объеме
- ✓ Общая площадь объектов «ИТ-парка», введенных в эксплуатацию составляет 23 164,8 кв.м.

\* Во втором полугодии 2014 года за счет средств бюджета Республики Татарстан проведены работы по дооборудованию и переустройству блоков Б, В и В1 на сумму 75 млн. руб. Данные мероприятия направлены на увеличение инвестиционной привлекательности и привлечение новых резидентов

### Ход строительства объектов технопарка

Введено в эксплуатацию, I квартал 2015 г.	<b>23 164,8</b>	кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2014 г.	<b>23 164,8</b>	кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2013 г.	<b>23 164,8</b>	кв.м.

- «ИТ-парк» в г. Набережные Челны построен и введен в эксплуатацию в 2012 году

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	73,54	73,54*
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,54</b>	<b>73,54</b>

# РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ: «ИТ-ПАРК»

участник Комплексной программы с 2011 года

Технопарк открыт с 2012 года

### «ИТ-парк», г. Набережные Челны:

- площадь земельного участка – 7,63 га.
- площадь объектов технопарка – 23 164,8 кв.м.
- годы строительства – 2011-2012 года
- сметная стоимость – 1 460,3 млн. руб.
- профинансировано из ФБ – 447 млн. руб.



### ИНФРАСТРУКТУРА:

- 1 Бизнес-инкубатор
- 2 Зона каворинга
- 3 Офисы арен-спасе
- 4 Пресс-центр
- 5 VIP-переговорная
- 6 Конференц-зал
- 7 Переговорные комнаты
- 8 Серверная
- 9 Центральный лифт
- 10 Кофейня
- 11 Холл
- 12 Вход в ИТ-парк
- 13 Отделение АкБарс банка
- 14 Отделение Почты России
- 15 Панорамный лифт
- 16 Столовая
- 17 Кафе
- 18 Парковка
- 19 Комнаты отдыха
- 20 Офисы арен-спасе
- 21 ИТ-академия
- 22 Центр робототехники и прототипирования




**Исполнение целевых показателей «ИТ-парк»** (по Бизнес-плану 2012 года, составленному на период 2012-2016 гг\* )

Наименование показателя	2012		2013		2014		План* в 2015 году	План* в 2016 году
	план	факт	План	факт	План*	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	60	70	150	86	80	95	94	94
Кол-во созданных рабочих мест (ед.)	962	501	2073	1156	1284	1396	1512	1512
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	186,8	351,7	2 877,8	1 471,4	3 358,4	3 052,6	4 023,6	4 215,5
Площадь объектов (м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	23 164,8	23 164,8	23 164,8	23 164,8	23 164,8	23 164,8	23 164,8	23 164,8

**! По состоянию на 01.01.2015 доля загрузки площадей технопарка резидентами составляет 100%**

\*Соглашением о предоставлении бюджету Республики Татарстан субсидии из федерального бюджета не предусмотрены плановые значения целевых показателей эффективности. Плановые значения указаны на основании письма №01/6419 от 18.09.2014, направленного в адрес Минкомсвязи России по вопросу учета измененных целевых показателей эффективности «ИТ-парк» в г. Набережные Челны с учетом поручения, данного в рамках заседания межведомственных комиссий по координации деятельности по созданию, функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий 22 июля 2014 г.

**Структура резидентов технопарка**

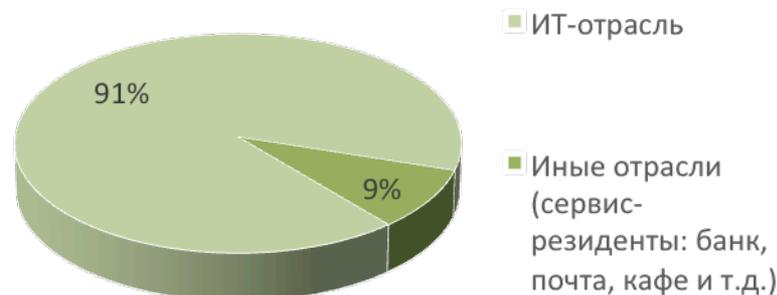

### Развитие экосреды технопарка в 2014 году

- В рамках развития отрасли информационных технологий, за 2014 год в проекты резидентов бизнес-инкубатора ГАУ «ИТ-парк» было привлечено более 100 млн. руб. венчурных инвестиций и грантов. Бизнес-инкубатор ГАУ «ИТ-парк» принял участие в более чем в 30 мероприятиях качестве участников, партнеров, экспертов и спикеров. К наиболее значимым мероприятиям можно отнести:
  - экспедиция Стартап Сабантуй 2014;
  - Kazan Startup Week 2014.
- Дата-центр ИТ-парка в 2014 году получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. К ранее существующим крупным клиентам в лице ОАО «Камаз» и ОАО «Татэнергосбыт» добавился ряд новых:
  - дочерняя структура одной из крупнейших госкорпорации «Ростех»;
  - дирекция Чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Казани в 2015 году.
- Открытие ИТ-дома в набережных Челнах на 118 квартир для сотрудников резидентов технопарка является уникальным проектом арендного жилья в России и направлено на привлечение ИТ-специалистов и компаний в регион.
- Открытие образовательного проекта на базе ИТ-академии в Набережных Челнах. В 2014 году из ИТ-академии было выпущено 79 специалиста, 30% из которых трудоустроены в компаниях резидентах ИТ-парка.



**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ТОЛЬЯТТИ:  
ТЕХНОПАРК  
«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»**

# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.

## Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010			50 000
2011	441 000	100% (441 000)	450 000
2012	137 000	100% (137 000)	288 350
2013	395 000*	100% (395 000)*	395 000
2014	416 500	100% (416 500)	1 359 150
<b>Итого 2007-2014</b>	<b>1 389 500</b>	<b>100% (1 389 500)</b>	<b>2 542 500</b>

\* По итогам проверки Счетной палаты Российской Федерации в январе 2015 г. был произведен возврат средств в размере 45 719,68 тыс. руб.

## Ход строительства объектов технопарка

Введено в эксплуатацию, I квартал 2015 г.	<b>67 144,48 кв.м.</b>
Введено в эксплуатацию, I квартал 2014 г.	<b>10 861,18 кв.м.</b>
Введено в эксплуатацию, I квартал 2013 г.	<b>0 кв.м.</b>

## Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Федеральный бюджет (тыс.руб.)	0	109 000	63 379,3	244 120,7
Региональный бюджет (тыс.руб.)	0	1 966,36	74 123,66	814 701,02
<b>Итого (тыс.руб.):</b>	<b>0</b>	<b>110 966,36</b>	<b>137 502,96</b>	<b>1 058 821,72</b>

## Выводы

- **Строительство объектов технопарка завершено.**
- Введено в эксплуатацию 67 144,48 кв. м. площадей объектов технопарка (с учетом объектов инженерной инфраструктуры).
- Дополнительно к указанной сумме освоения регионального бюджета за 2014 год было израсходовано 450 млн. рублей на оснащение центра технического обеспечения. Планируется завершение оснащения центра из средств регионального бюджета в 2015-2016гг. на сумму 800 млн. руб.
- Общий объем инвестиций на создание технопарка - 5 182 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 1 389,5 млн. руб. (освоено – 1 389,5 млн. руб.).

# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

## «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

Общая площадь земельных участков - 28 га.

Общая площадь объектов - 67 144,48 кв. м.

участник Комплексной программы с 2010 г.

### Производственный комплекс, корпус 3.2

Площадь 2 294 кв. м.

Год постройки - 2014

### Производственный комплекс, корпус 3.1

Площадь 1 725 кв. м.

Год постройки - 2014

### Офисно-лабораторный комплекс, корпус 2.2

Площадь 10 680 кв. м.

Год постройки 2014

### Офисно-лабораторный комплекс, корпус 2.1

Площадь 10747,4 кв. м.

Год постройки 2013

### Центр технического обеспечения

Площадь 2 844 кв. м.

Год постройки - 2014

### Офисно-лабораторный комплекс, корпус 2.4

Площадь 10 689 кв. м.

Год постройки 2014

### Офисно-лабораторный комплекс, корпус 2.3

Площадь 10 775,1 кв. м.

Год постройки 2014

### Административное здание

Площадь 17 276,2 кв. м.

Год постройки 2014



# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.

Объекты технопарка, созданные в 2013 г.

## Офисно-лабораторный комплекс. Корпус 2.1.

- Площадь 10747,4 кв. м.
- Годы строительства 2011-2013
- Сметная стоимость 417,4 млн.руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ – 278,0 млн. руб.)



Фото  
I кв. 2014



Фото  
I кв. 2015

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

## Административное здание

- Площадь 17 276,2 кв. м.
- Годы строительства 2011-2014
- Сметная стоимость - 812 397,28 тыс. руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ - 323 463,09 тыс. руб.)



Фото  
I кв. 2014



Фото  
I кв. 2015

# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

Офисно-лабораторный комплекс: корпуса 2.2, 2.3, 2.4

- Площадь 32 144,1 кв. м.
- Годы строительства 2011-2014
- Сметная стоимость 1 156,87 млн. руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ - 623,64 млн. руб.)

Корпус 2.2.



Корпус 2.3.



Корпус 2.4.



# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

**Производственный комплекс: корпуса 3.1 и 3.2**

- Площадь 4 019 кв. м.,
- Годы строительства 2011-2014
- Сметная стоимость - 383 123,71 тыс. руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ - 158 393,46тыс. руб.)

Корпус 3.1.



Корпус 3.2.



# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.

Объекты технопарка, созданные в 2014 г.

## Центр технического обеспечения

- Площадь 2 844 кв. м.
- Годы строительства 2011-2014
- Сметная стоимость - 825 675,93 тыс. руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ - 16 002,80 тыс. руб.)
- Результат на 2015 год: объект введен в эксплуатацию, ведется оснащение высокотехнологичным оборудованием



## Инженерная инфраструктура технопарка

№ п/п	Объект (заполняется укрупненно)	Вложено средств фед. бюджета	Вложено средств рег. бюджета	Общая стоимость	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Внутриплощадочные электрические сети	0,00 тыс.руб.	74 866,21 тыс.руб.	74 866,21	III кв. 2013	IV кв. 2013- II-IV кв.2014
2	Трансформаторные подстанции	0,00 тыс.руб.	41 595,36 тыс.руб.	41 595,36	III кв. 2013	IV кв. 2013
3	Внутриплощадочные инженерные сети	0,00 тыс.руб.	79 779,16 тыс.руб.	79 779,16	III кв. 2013	IV кв. 2013
4	Внутриплощадочные слаботочные сети	0,00 тыс.руб.	11 650,21 тыс.руб.	11 650,21	I-IV кв. 2014	II-IV кв. 2014
5	Внутриплощадочные сети связи	0,00 тыс.руб.	75 242,67 тыс.руб.	72 242,67	I-IV кв. 2014	II-IV кв. 2014
6	Благоустройство и озеленение	0,00 тыс.руб.	206 603,39Тыс.руб.	206 603,39	I-IV кв. 2014	II-IV кв. 2014

# САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

участник Комплексной программы с 2010 г.


## Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану 2011 года)

Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 План (нарастающим итогом)	Итоговый план в 2018 году (нарастающим итогом)
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	0	0	20	15	130	27	182	200
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	0	0	400	239	3100	331	3 200	3 500
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	0	0	76	90,44	3346	180,28	3 580,23	4 385,94
Бюджетная эффективность проекта (млн.руб.)	0	0	-	9,58	481,8	20,08	501,2	613,9
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	0	0	8 849	10 861,18	55 540	67 144,48	67 144,48	67 144,48

## Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- Технопарк функционирует
- Сведения о запуске в 2014 г. элементов инфраструктуры для резидентов: созданы бизнес-инкубатор, коворкинг-центр, учебно-тренинговый центр, Региональный центр инжиниринга, Межрегиональный ресурсный центр, центр коллективного пользования оборудованием: лаборатории IT-технологий, нанотехнологий, энергоэффективных технологий.
- Проведено 369 мероприятий в технопарке.
- Взаимодействие с институтами развития РФ: количество компаний - 15, объем привлеченного финансирования - 29 033 тыс. рублей.

Структура резидентов технопарка

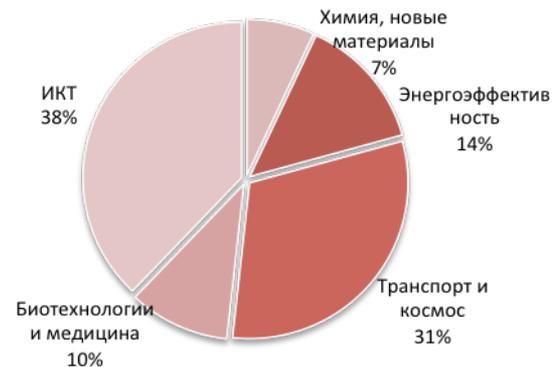



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



# МОСКВА «ФИЗТЕХПАРК»

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	150 000	0% (0)	1 381 865
2014	265 842	100% (415 842)*	252 462
<b>Итого 2007-2014</b>	<b>415 842</b>	<b>(100)% (415 842)</b>	<b>1 634 327</b>

\* Включая остаток средств субсидии 2013 года в размере 150 000 тыс. руб.

### Ход строительства объектов технопарка



### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	415,8	415,8
Региональный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	252,5	252,5
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668,3</b>	<b>668,3</b>

### Выводы


- **Строительство объектов технопарка продолжается**
- Введено в эксплуатацию 0 кв.м. площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка – 2 050 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 415 млн. руб. (освоено - 415 млн. руб.).
- Сумма перенесенных остатков средств федерального бюджета составила 150 млн. руб.

# МОСКВА

## «ФИЗТЕХПАРК»


Площадь участка - 2,2 га.

Общая площадь объекта - 30 709,9 кв. м.

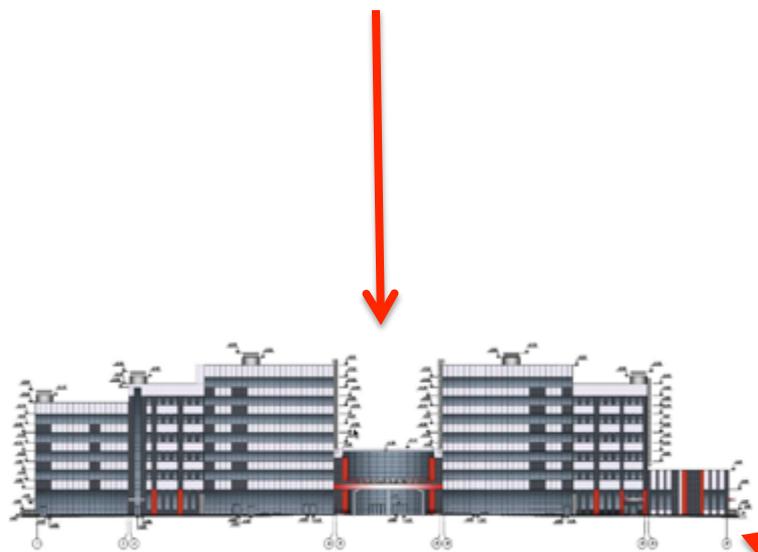

участник Комплексной программы с 2013 г.

Планировка территории кластера «Физтех-XXI»:

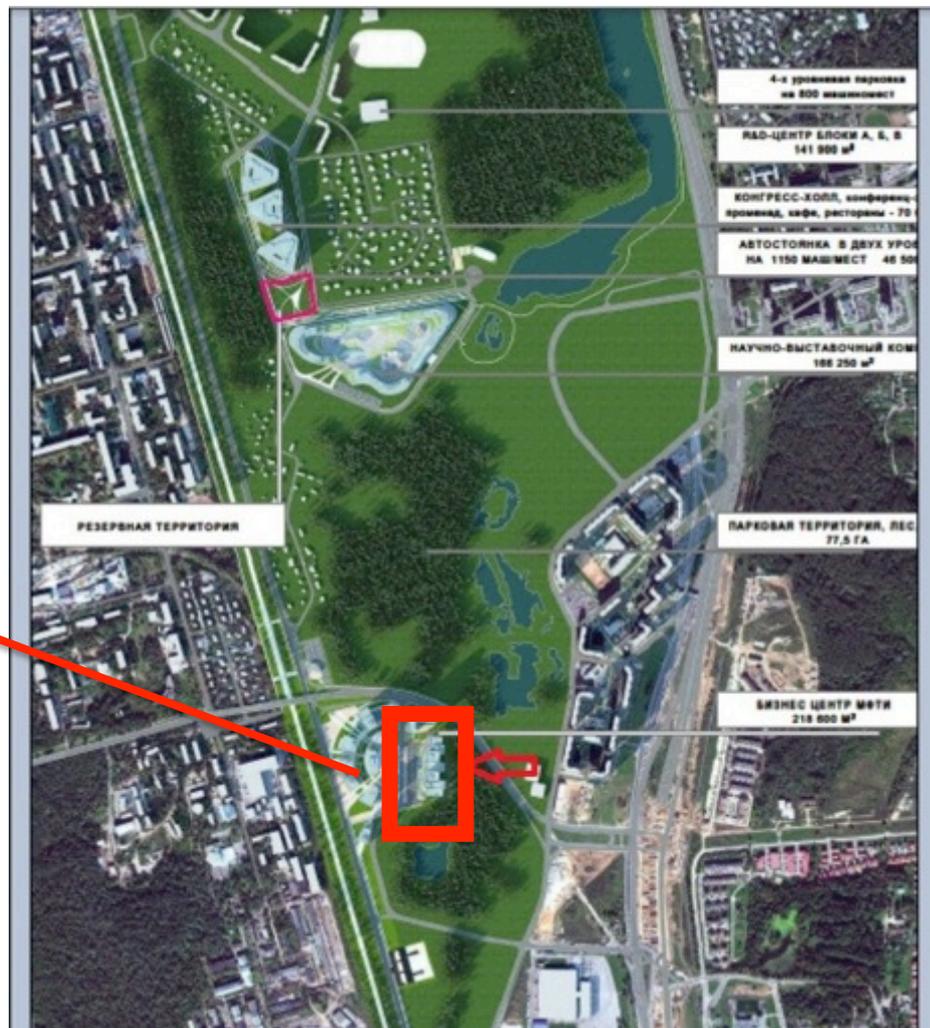

# МОСКВА

## «ФИЗТЕХПАРК»

участник Комплексной программы с 2013 г.

### Ход строительства объекта технопарка

Технопарк, Москва, р-он Северный,  
Долгопрудненское шоссе, д.3

- площадь, 30 709,9 кв. м.,
- годы строительства, 2013-2015
- сметная стоимость 2 050 млн.руб.  
(в т.ч. профинансировано из ФБ –  
415 842 млн.руб.)



### Инженерная инфраструктура технопарка

№ п/п	Объект (заполняется укрупненно)	Вложено средств фед. бюджета	Вложено средств рег. бюджета	Общая стоимость	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Оборудование	0 тыс.руб.	515 319 тыс.руб.	515 319 000	515 319 000	0

### Целевые показатели технопарка (по конкурсной заявке 2013 года)

Наименование показателя	2014		2015	2016	2017	Итоговый план в 2018 году
	план	факт	план	план	план	
Количество компаний – резидентов (ед.)	0	0	15	19	23	25
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	0	0	300	600	800	1 300
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	0	0	515	1 535	1 540	2 050
Бюджетная эффективность проекта (млн.руб.)	0	0	106	410	718	2 050
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	30,9	0	15	30,9	30,9	30,9

### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- Технопарк не функционирует
- Проведено 1 мероприятие в технопарке
- Создан экспертный совет из ведущих специалистов IT индустрии
- Партнеры технопарка

100% потенциальных резидентов технопарка составляют ИТ-компании



- Потенциальные резиденты технопарка





технопарк  
**Университетский**



**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
Технопарк «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»**

# СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

участник Комплексной программы с 2013 г.

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	341 450,0		355 593,0
2014	310 356,7	93,5% (609 262,7)*	294 651,3
Итого 2007-2014	<b>651 806,7</b>	<b>93,5% (609 262,7)**</b>	<b>650 244,3</b>

\* Включая перенесенный остаток средств субсидии 2013 года в размере 341 450,0 тыс. руб.

\*\*Остаток средств (экономия) 2014 года в размере 42 544,0 тыс. руб.

### Ход строительства объектов технопарка

Введено в эксплуатацию, I квартал 2015 г.	0	.... кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2014 г.	0	.... кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2013 г.	0	.... кв.м.

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн. руб.)	0	0	45,6	563,7	609,3
Региональный бюджет (млн. руб.)	0,5	46,6	47,4	200,2	294,7
<b>Итого (млн. руб.):</b>	<b>0,5</b>	<b>46,6</b>	<b>93,0</b>	<b>763,9</b>	<b>904,0</b>

### Выводы

- **Строительство здания технопарка завершено.**
- **Готовность объекта с учетом инженерной инфраструктуры и благоустройства территории – 95%.**
- **Общий объем принятых в 2013 – 2014 годах обязательств по государственным контрактам, заключенным с целью строительства технопарка, – 1 271,0 млн. руб.** За счет средств федерального бюджета израсходовано (по состоянию на 01.01.2015 г. освоено по актам) – **609,3 млн. руб.**, за счет средств областного бюджета израсходовано – **650,2 млн. руб.** (по состоянию на 30.03.2015 г. освоено по актам – 521,8 млн. рублей, акты на оставшийся объем обязательств будут представлены в ближайшее время). Остаток обязательств по гос. контрактам в объеме 11,5 млн. руб. будет профинансирован в 2015 году за счет средств областного бюджета.
- По результатам торгов получена **экономия средств федерального бюджета в объеме 42,5 млн. руб.**, которая в соответствии с нормами бюджетного законодательства **перечислена в доходы федерального бюджета.**

# СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


## ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

участник Комплексной программы с 2013 г.

Общая площадь земельных участков 51,2 га;

Общая площадь объектов технопарка 91 000 кв. м. (всего);

В рамках комплексной программы строится объект ИТЦ площадью 28 050 кв. м.

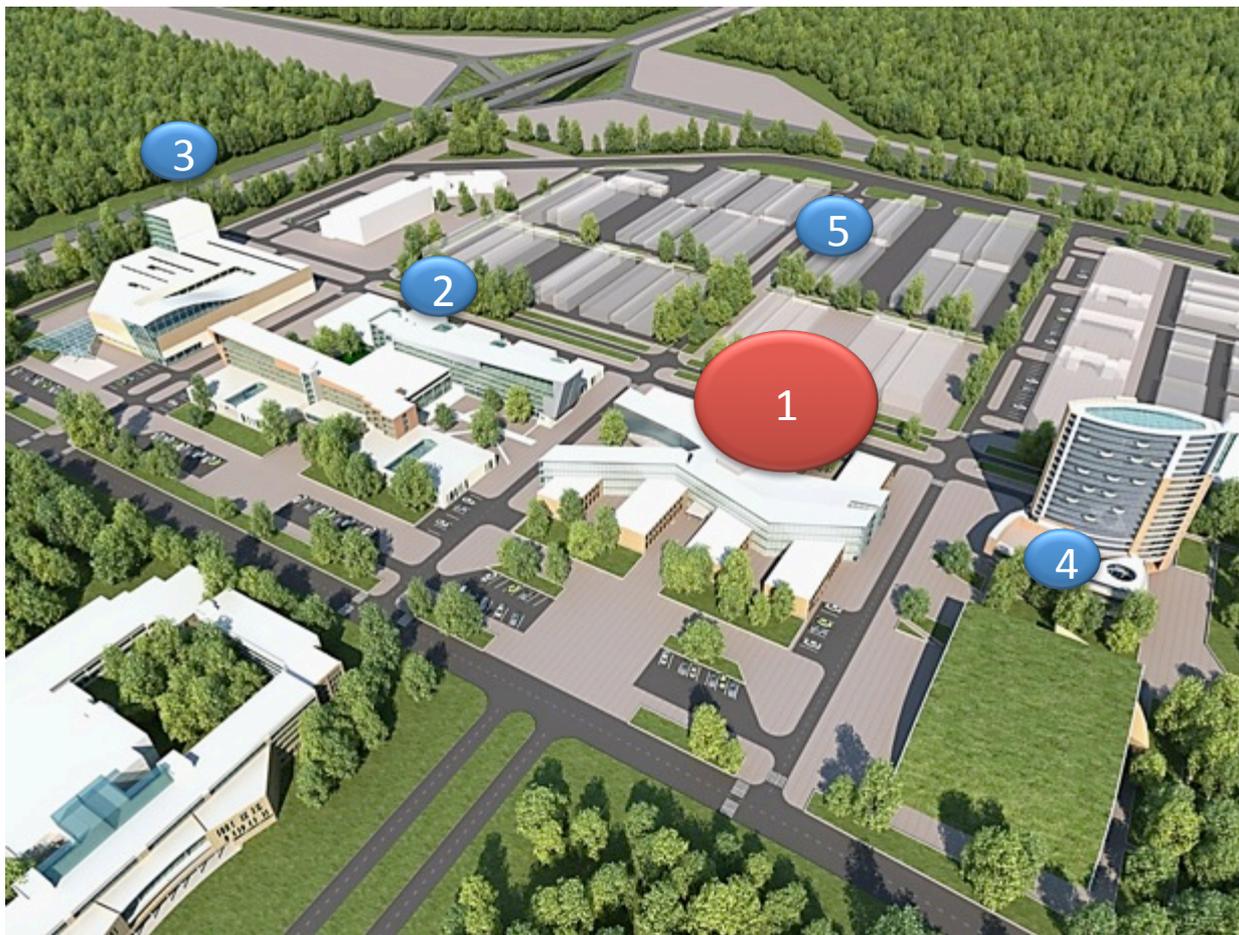

**1. Инновационно-технологический центр (ИТЦ), площадь 28 050 кв.м, 2013 – 2014 гг.;**

2. Научно-инновационный центр с бизнес-инкубатором , площадь - 31 140 кв. м., 2016 – 2017 гг.

3. Выставочно-информационный центр и объекты жилого назначения, площадь - 17 000 кв. м., 2017 – 2018 гг.

4. Конференц-комплекс с гостиницей и торговым центром и объектами жилого назначения, площадь -15 000 кв. м., 2017 – 2018 гг.

5. Лабораторно – офисные, лабораторно-производственные модули 2017 – 2020 гг.

# СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

участник Комплексной программы с 2013 г.

Инновационно-технологический центр технопарка

- Площадь - 28 050 кв. м.
- Годы строительства - 2013 – 2014 гг.
- Общая сметная стоимость – 1 345,8 млн .руб., по итогам торгов заключены государственные контракты на сумму - 1 271,0 млн. руб. (в т.ч. профинансировано из ФБ - 609,3 млн. руб., экономия – 42,5 млн. руб. перечислена в доход федерального бюджета)



Фото  
I кв. 2014



Фото  
I кв. 2015



Фото  
I кв. 2014



Фото  
I кв. 2015

### Инженерная инфраструктура технопарка

№ п/п	Объект (заполняется укрупненно)	Вложено средств фед. бюджета	Вложено средств рег. бюджета	Общая стоимость, млн. руб.	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Водоснабжение и канализация *	-	10,0	15,4	2014 г.	2015 г.
2	Теплоснабжение	-	30,6	30,6	2014 г.	2014 г.
3	Электроснабжение	-	154,0	154,0	2014 г.	2014 г.

\* Регионом дополнительно инвестировано 153,6 млн. руб. в создание инженерной инфраструктуры с учетом комплексного развития территории, включающего строительство объектов нового кампуса Уральского федерального университета

# СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

участник Комплексной программы с 2013 г.

### Целевые показатели технопарка по конкурсной заявке (рассчитаны на объект ИТЦ технопарка)

Наименование показателя	2014		2015 план	2016 план	2017 план	Итоговый план в 2018 году**
	план	факт				
Количество компаний – резидентов (ед.)	-	-	15	23	30	37
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	-	-	200	460	550	700 <*>
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	-	-	487,8	1 463,4	1 463,4	1 951,1
Бюджетная эффективность проекта (%)	-	-	5	20	35	55
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	28 050	28 050 <*>	-	-	-	-


<\*> высокотехнологичных рабочих мест

### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- **Строительство здания технопарка завершено.**
- 29 декабря 2014 года состоялось открытие Инновационно-технологического центра технопарка <\*>.

**В течение 1 квартала 2015 года сформирован пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.**



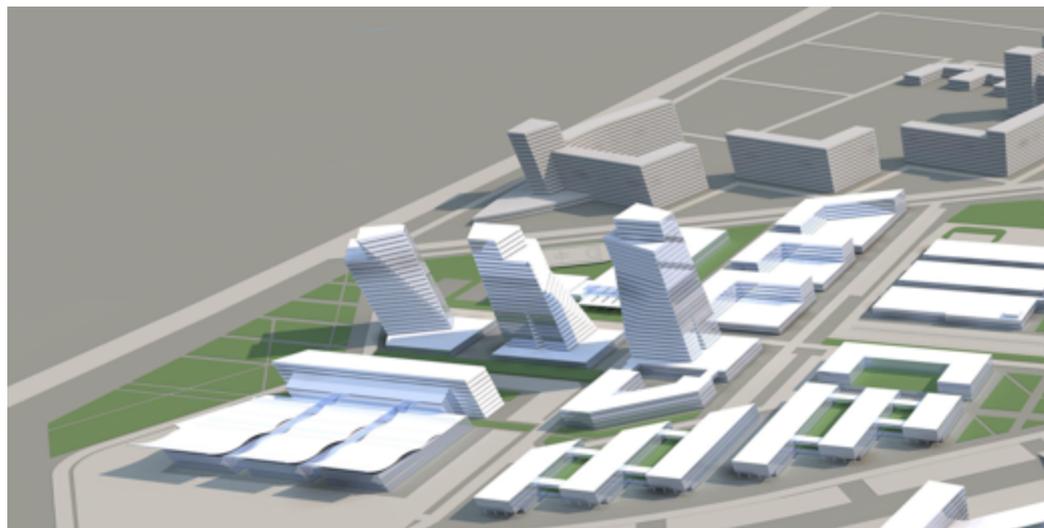

**НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
технопарк «ИТ-парк АНКУДИНОВКА»**

# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


## ТЕХНОПАРК «АНКУДИНОВКА»

Участник комплексной программы с 2007 г.

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	340 000	95% (322 737)	353 572
2008	248 139	89% (221 386)	248 463
2009	264 145	92% (244 002)	277 435
2010	-	-	174 487
2011	-	-	77 768
2012	335 000	72% (242 769)	377 511
2013	-	-	149 907
2014	214 637	28% (59 891)	124 263
Итого 2007-2014	1 401 921	78% (1 090 785)	1 783 406

### Ход строительства объектов технопарка

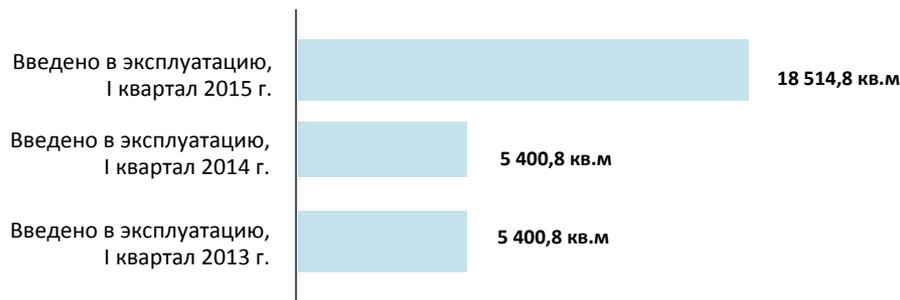

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн руб.)	0	0	0	59,9	59,9
Региональный бюджет (млн руб.)	24,5	0	0	99,8	124,3
<b>Итого (млн руб.):</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,7</b>	<b>184,2</b>

### Выводы

- **Строительство объектов технопарка завершено.**
- Введено в эксплуатацию 18 514,8 кв.м площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка – 2 874,2 млн руб., из них средств федерального бюджета – 1 090,8 млн руб.

# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «АНКУДИНОВКА»

Участник комплексной программы с 2007 г.

Общая площадь земельных участков 25 га.

Общая площадь объектов технопарка - 109 114 кв. м.

1. **Бизнес-центр** (Бизнес-инкубатор). Площадь 1-ой очереди 13 114 кв.м., 2014г. Построен.
2. **Гостиница**. Площадь 5 000 кв.м., 2017г. Не построена.
3. **Комплексный диагностический центр**. Площадь 6000 кв.м., 2019 г. Не построен.
4. **Комплексный центр Сбербанка России**. Площадь 42 000 кв.м., 2013г. Построен.
5. **Медицинский центр «Мать и дитя НН»**. Площадь 33 000 кв.м., 2018г. Не построен.
6. **Головной расчетно-кассовый центр Центробанка России**. Площадь 10 000 кв.м., 2019г. Не построен.

**Водовод**. Протяженность 14 км, 2013 г. Построен.

**Котельная**. Площадь 1 300 кв.м, 2013 г. Построена.

**Кабельные линии КЛ-110 Кв.**

Протяженность 1,8 км, 2010г. Построены.



# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «АНКУДИНОВКА»

Участник комплексной программы с 2007 г.

Объект технопарка, созданный в 2014 году:

### Бизнес-центр - многофункциональный корпус с конференц-залом

- площадь 13 114 кв. м.,
- годы строительства 2012-2014,
- сметная стоимость 1 010 459 тыс. руб.  
(в т. ч. профинансировано из ФБ – 302 660 тыс. руб.)



Март 2014 г.



Март 2015 г.

# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «АНКУДИНОВКА»

Участник комплексной программы с 2007 г.

### Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану 2012 года)

Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 План	Итоговый план 2016 году
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	30	27	40	33	70	2	101	101
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	450	467	545	499	765	146	1860	1860
Годовой объем выручки резидентов (млн руб.)	548,4	633,9	582,5	798,7	860	245,2	1 400	3800
Бюджетная эффективность проекта (млн руб.)	80,6	93,2	85,6	117,4	126,4	36,0	205,8	558,6
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	5 401	5 401	5 401	5 401	18 515	5 401	18 515	30 401

### Развитие экосреды технопарка в 2014 году


#### Технопарк функционирует.

В 2014 году технопарк «ИТ-парк Анкудиновка»

был представлен на мероприятиях:

- Международная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций МИПИМ 2014 (11-14 марта 2014 г., г. Канны, Франция).
- Международный конгресс Открытая Россия инновационное развитие экономики (21-22 марта 2014 г. г. Москва, Россия).
- «Связь-Экспокомм» (май 2014 г., Москва, Россия).

Структура резидентов технопарка





**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
технопарк «ОБНИНСК»**

# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «ОБНИНСК»

участник Комплексной программы с 2007 года

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	513 000,00	0 % (0)	13 756,0
2008	0	1,8 % (9 417,9*)	13 215,2
2009	0	35 % (6791,9**)	17 645,2
2010	199 673,2	0 % (0)	14 447,5
2011	0	25 % (49 895,3***)	50 015,1
2012	101 500,0	5,5 % (13 472,2****)	14 075,9
2013	0	7,5 % (17 326,9*****)	25 656,9
2014	0	0 % (0)	6 322,1
Итого 2007-2014	814 173,2	74,76 % (96 904,2)	155 133,9

\*) Включая остаток средств 2007 года в размере 513,0 млн. руб.


\*\*) Включая остаток средств 2007 года в размере 19,4 млн. руб.

\*\*\*) Включая остаток средств 2010 года в размере 199,7 млн. руб.

\*\*\*\*) Включая остаток средств 2010 года в размере 143,9 млн. руб.

\*\*\*\*\*) Включая остаток средств 2012 года в размере 231,96 млн. руб.

### Ход строительства объектов технопарка

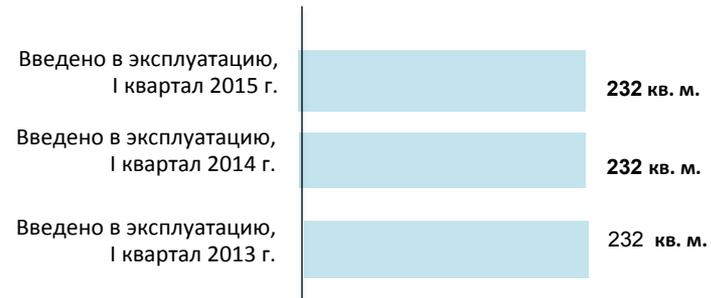

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет (млн.руб.)	0,02	0,91	5,39	0	6,32
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0,02</b>	<b>0,91</b>	<b>5,39</b>	<b>0</b>	<b>6,32</b>

### Выводы

- **Строительство объектов технопарка продолжается.**
- Введено в эксплуатацию 232 кв. м площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка 503,5 млн. руб., из них средств федерального бюджета - 328,9 млн. руб. (освоено – 96,9 млн. руб.).
- Сумма перенесенных остатков средств федерального бюджета составила 964,0 млн. руб.


# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «ОБНИНСК»

участник Комплексной программы с 2007 года

Общая площадь земельных участков **51,5 га:**

Общая площадь объектов технопарка **7739,76 кв. м:**

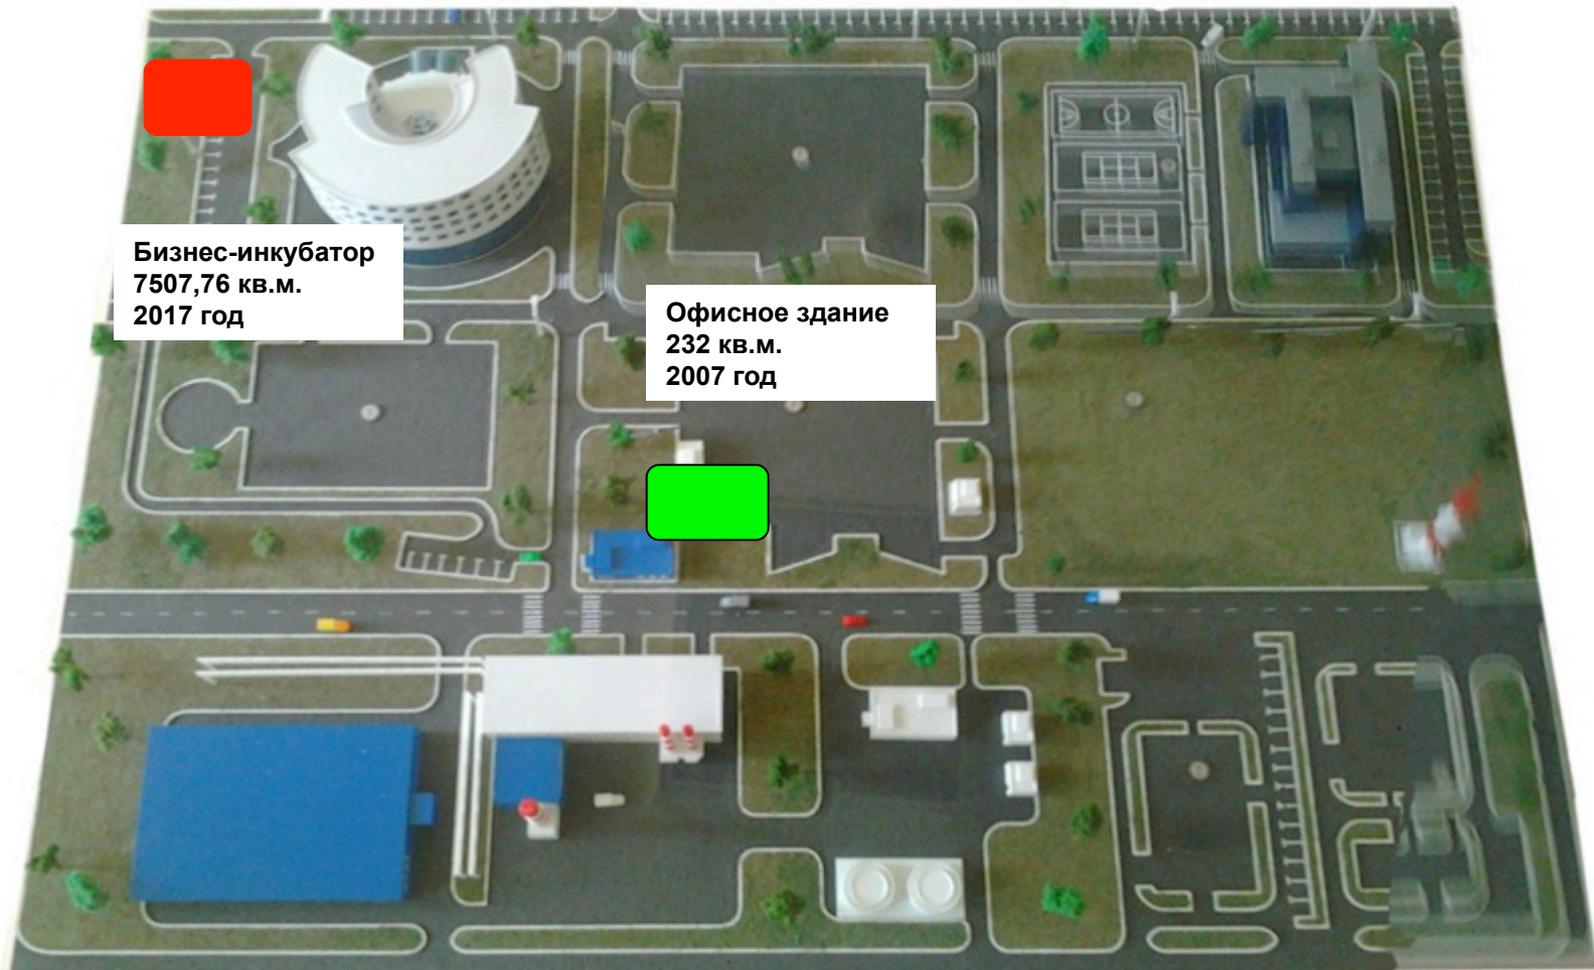

# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТЕХНОПАРК «ОБНИНСК»

участник Комплексной программы с 2007 года

### Здание бизнес-инкубатора на территории площадки №1 технопарка Обнинск

- площадь: 7507,7 кв. м.,
  - годы строительства: с 2011 по настоящее время,
  - сметная стоимость 504,1 млн.руб.
- (в т. ч. профинансировано из ФБ – 49,5 млн. руб.)



I кв. 2014



I кв. 2015

### Эскиз



№ п/п	Объект	Вложено средств фед. бюджета	Вложено средств рег. бюджета	Общая стоимость	Ввод в эксплуатацию	
					план	факт
1	Внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации площадки № 1 технопарка Обнинск	31 177,7 тыс. руб.	26 728,6 тыс. руб.	80 227,5 тыс. руб.	2014 г.	
2	Внешний водопровод площадки № 1 технопарка Обнинск	0,0 тыс. руб.	10 726,5 тыс. руб.	38 614,3 тыс. руб.	2014 г.	

### Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану 2010 года)

Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 план	Итоговый план в 2016 году
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	-	-	25	-	46	-	78	78
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	-	-	697	-	1552	-	2484	2484
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	-	-	2702,2	-	5914,2	-	9574,3	9574,3
Бюджетная эффективность проекта (млн. руб.)	-	-	-	-	1055,0	-	1055,0	1378,7
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	0,2	0,2	18,6	0,2	18,6	0,2	18,6	18,6


### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.


Причина недостижения показателей – перенесение сроков строительства в связи с необходимостью допроектирования объекта бизнес-инкубатор.

В настоящее время завершается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры технопарка (сети водопровода, хозяйственно-бытовая и дождевая канализация, тепловые сети, энергоснабжение, дороги, уличное освещение, связь) для последующего ввода объектов в эксплуатацию. Ведутся переговоры с частными инвесторами в целях возможного завершения строительства бизнес-инкубатора посредством государственно- частного партнерства.

Создается резидентная структура технопарка. Заключено 5 соглашений о намерениях реализации инновационных проектов на территории технопарка; 1 соглашение с сервисной компанией о сотрудничестве в области оказания услуг резидентам технопарка; 1 заявка на получение статуса резидента находится в стадии рассмотрения экспертным советом технопарка.

Планируемая структура резидентов технопарка

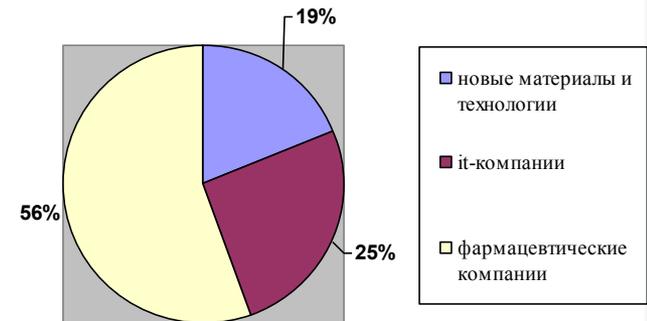

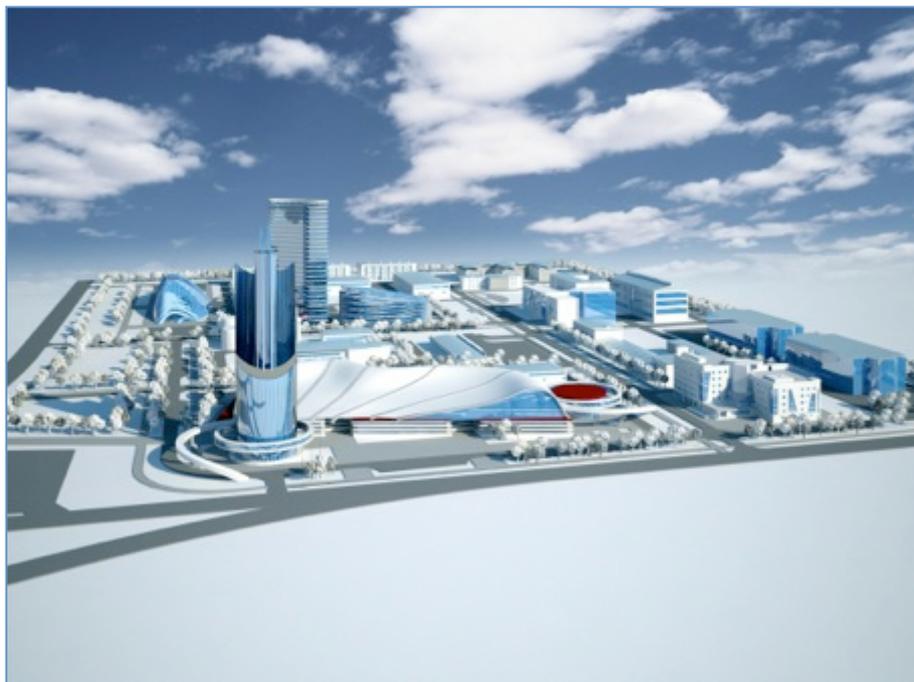

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
«КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК»**

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК»

участник Комплексной программы с 2008 г.

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2007	-	-	-
2008	100 000	99% (99 309)	37 236,93*
2009	100 000	100% (100 000)	162 534,90*
2010	72 608	100% (72 608)	76 621,97*
2011	81 000	100% (81 000)	81 000,00*
2012	138 000	43% (60 000)	63 427,22*
2013	-	-	51 788,97**
2014	-	-	34 832,12**
Итого 2007-2014	491 608	84% (412 917)	507 442,10

\*Расходы регионального бюджета в рамках Соглашений (без учета ПИР и прочих расходов).

\*\*Расходы регионального бюджета за СМР, ПИР и прочие расходы.

### Ход строительства объектов технопарка

Введено в эксплуатацию, I квартал 2015 г.	15 087	кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2014 г.	15 087	кв.м.
Введено в эксплуатацию, I квартал 2013 г.	15 087	кв.м.

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет** (млн.руб.)	5,00	9,60	14,91	5,32	34,83
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>5,00</b>	<b>9,60</b>	<b>14,91</b>	<b>5,32</b>	<b>34,83</b>

### Выводы

- **Строительство объектов технопарка продолжается.**
- Введено в эксплуатацию 15 087 кв.м. площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка – 999, 05 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 491,6 млн. руб. (освоено – 412,9 млн. руб.).
- Неиспользованный остаток 2012 года в размере 78 млн.руб. возвращен в 2013 году.

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК»

участник Комплексной программы с 2008 г.

Общая площадь земельных участков 10 га.;

Общая площадь объектов технопарка 71174 кв. м.



# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК»


участник Комплексной программы с 2008 г.

### Исполнение целевых показателей (по бизнес-плану 2012 года)

Наименование показателя	2012		2013		2014		2015 план	Итоговый план в 2016 году
	план	факт	план	факт	план	факт		
Количество компаний – резидентов (ед.)	41	35	60	43	118	43	132	138
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	259	231	359	396	609	338	682	710
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	1598	1206	4076	1575	8350	1547	5132	2634
Бюджетная эффективность проекта (млн.руб.)	57,5		103,4		518,2	182	746,8	387,3
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	15,1	15,1	18,6	15,1	22,1	15,1	37,1	37,1

### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- Технопарк функционирует
- В 2014 г. созданы Центр кластерного развития и Региональный центр инжиниринга;
- Проведено 153 мероприятий и конференций в технопарке;
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий – профинансировано 34 компании на сумму 29 млн.руб.





Тюменский  
ТЕХНОПАРК



**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГБУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»**

# ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»


участник Комплексной программы с 2007 г.

### Общий объем финансирования

Год	Федеральный бюджет (факт)	Исполнение по федеральному бюджету	Региональный бюджет (факт)
	тыс.руб.	% (тыс.руб.)	тыс.руб.
2006	-	-	11 244
2007	298 906	100% (298 906)	294 013
2008	300 000	0%	560 877
2009	-	-	12 275
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	-	-	-
Итого 2006-2014	598 906	100% (298 906)	878 409

\* остаток субсидий 2008 года в размере 30 227,1 тыс.руб. возвращен в 2010 году и в размере 269 772,9 тыс.руб. возвращен в 2012 году.

### Ход строительства объектов технопарка

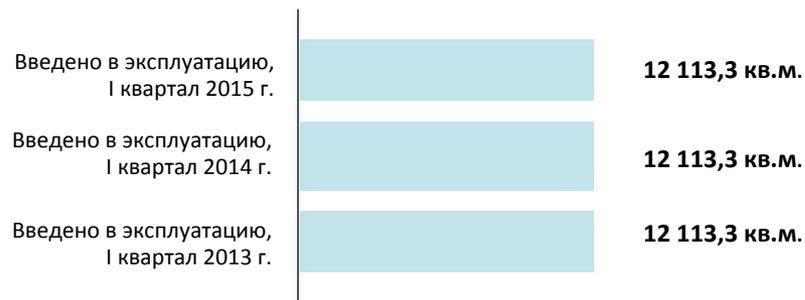

### Освоение бюджетных средств в 2014 году

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Федеральный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
Региональный бюджет (млн.руб.)	0	0	0	0	0
<b>Итого (млн.руб.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Выводы

- **Строительство объектов технопарка завершено.**
- В 2009 г. введено в эксплуатацию 12 113,3 кв.м. площади объектов технопарка
- Общий объем инвестиций на создание технопарка - 1 477, 315 млн. руб., из них средств федерального бюджета - 599 млн. руб. (освоено - 299 млн. руб.), однако все средства федерального бюджета в 2012 год возвращены.

# ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

участник Комплексной программы с 2007 г.

Общая площадь земельных участков 0,9665 га.;

Общая площадь объектов технопарка 12 113,3 кв. м.

Введен в эксплуатацию



# ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

участник Комплексной программы с 2007 г.

### Исполнение целевых показателей

Наименование показателя	2012		2013		2014	
	план	факт	план	факт	план	факт
Количество компаний – резидентов (ед.)	-	52	-	44	-	<b>50</b>
Количество созданных рабочих мест, всего (ед.)	-	799	-	820	-	<b>914</b>
Годовой объем выручки резидентов (млн. руб.)	-	1 360	-	1 811	-	<b>2 265,5</b>
Бюджетная эффективность проекта (млн.руб.)	-	275,2	-	341,6	-	<b>330,8</b>
Площадь объектов (тыс. м <sup>2</sup> , нарастающим итогом)	12,113	12,113	12,113	12,113	12,113	12,113

### Развитие экосреды технопарка в 2014 г.

- **Технопарк функционирует**
- В 2014 г. создан *Центр прототипирования Технопарка*;
- Проведено более 180 мероприятий и конференций в технопарке, включая форумы-выставки НЕФТЬГАЗТЭК и ИНФОТЕХ;
- От *Фонда содействия инновациям* привлечено 37,9 млн. рублей, в том числе: «УМНИК» - 76 человек, контракты на сумму 14,6 млн. рублей; «СТАРТ» - 7 предприятий, контракты на сумму 11 млн. рублей; «Коммерциализация» – 4 предприятия, на сумму 12,3 млн. рублей.
- Частные инвестиции в проекты резидентов технопарка - 70,24 млн. руб.

Структура резидентов технопарка

